

(仮称)西部統合小学校建設計画 説明会

江津市教育ビジョン

「ふるさと江津を愛し、豊かな心で、明日を創る人」




江津市・江津市教育委員会

【ご説明内容】

1. 江津市の小学校教育・小学校再編の考え方について
2. 西部地区の統合小学校の経緯について
3. 津宮小学校敷地への建設決定理由について
4. 津宮小学校敷地利用での概略計画について

『江津市教育大綱』

学びの環境整備 および 体制づくりの一環



『第2次学校整備基本計画』

市内の小学校は再編整備し、新統合校舎を建設すべき
西部の小学校(3校)に集約

『整備の基本方針(抜粋)』

教育活動をより充実、全ての利用者にとって安全
安心な学校、ユニバーサルデザイン、ICT化利活用、
地域拠点など……

2. 西部地区の統合小学校の経緯について

年	月 日	内 容
平成23年	3月16日	市議会情報交換会で、第2次学校整備再編基本計画を説明 (中学校区ごとに小学校統合再編)
	5月17日	川波小学校PTA役員に説明
	6月1日	川波小学校PTA役員に説明
	6月2日	津宮小学校PTA役員に説明
	10月13日	津宮小学校PTA会長から統合受け入れの報告書提出 「統合時に新校舎建設を条件」
	11月7日	波子地区説明会
	11月8日	敬川地区説明会
	12月7日	二宮地区説明会
	12月14日	都野津地区説明会
	12月15日	有福温泉地区説明会
	平成24年	1月17日
1月30日		津宮小学校PTA役員に地区説明会の状況報告
5月9日		波子地区就学前児童保護者説明会
5月10日		敬川地区就学前児童保護者説明会
5月11日		有福温泉地区就学前児童保護者説明会
平成25年	2月27日	川波小学校PTA会長、波子・敬川・有福温泉地区代表者 から教育長へ回答書提出 ●「統合やむなし」

年	月 日	内 容
平成26年	1月21日	川波小学校PTA説明会
	2月12日	津宮小学校PTA役員に説明
	10月22日	波子・有福コミュニティセンター長へ経過報告
	10月25日	敬川地区説明会
	10月29日	二宮地区コミュニティ役員会で説明
	11月13日	津宮小学校PTA説明会
	平成27年	3月8日
3月9日		跡市連合自治会長、跡市小学校PTA会長から統合合意を市教育委員会へ報告
3月17日		跡市地区から、市長・教育長へ要望書・報告書を提出
8月3日		市議会（総務文教委員会）に対して、跡市小学校の津宮小学校への統合経過を説明
12月2日		教育委員会で、跡市小学校廃止について承認
12月7日		平成27年第4回議会定例会で、廃校に伴う条例改正を提案
平成28年	3月20日	跡市小学校閉校式 校旗・校名板の返還




平成28年熊本地震により庁舎改修整備方針が再検討され、新庁舎建設を優先。


3. 津宮小学校敷地への建設決定理由について

A案

津宮小学校

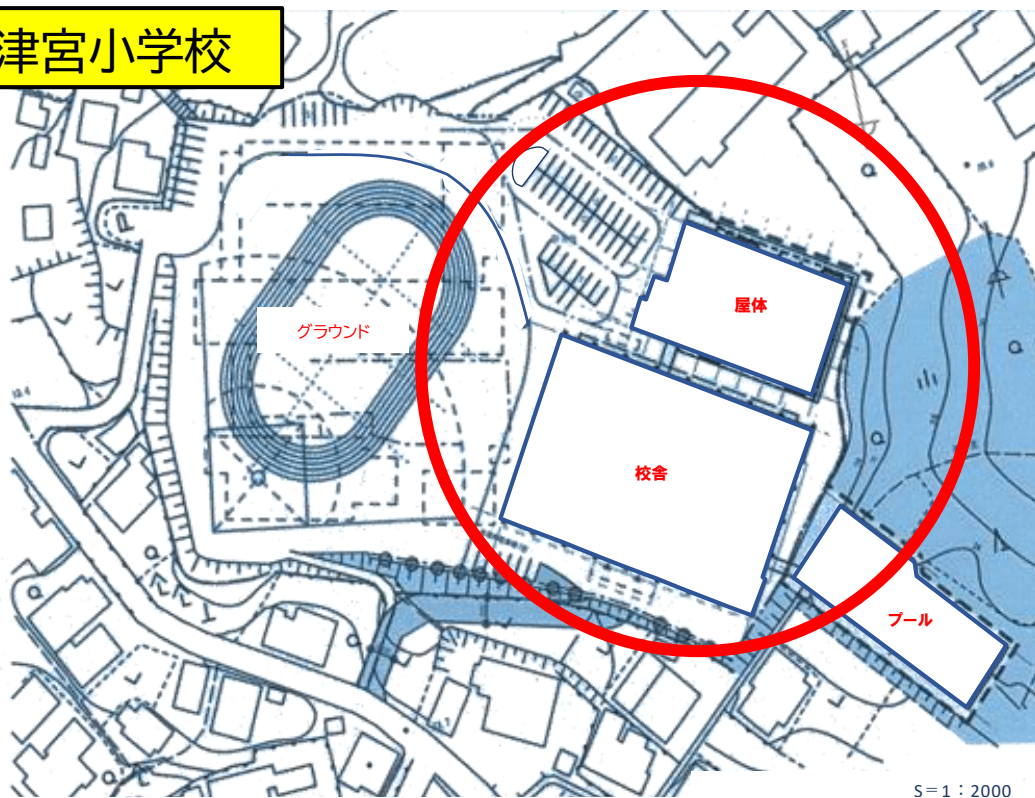

青陵中学校

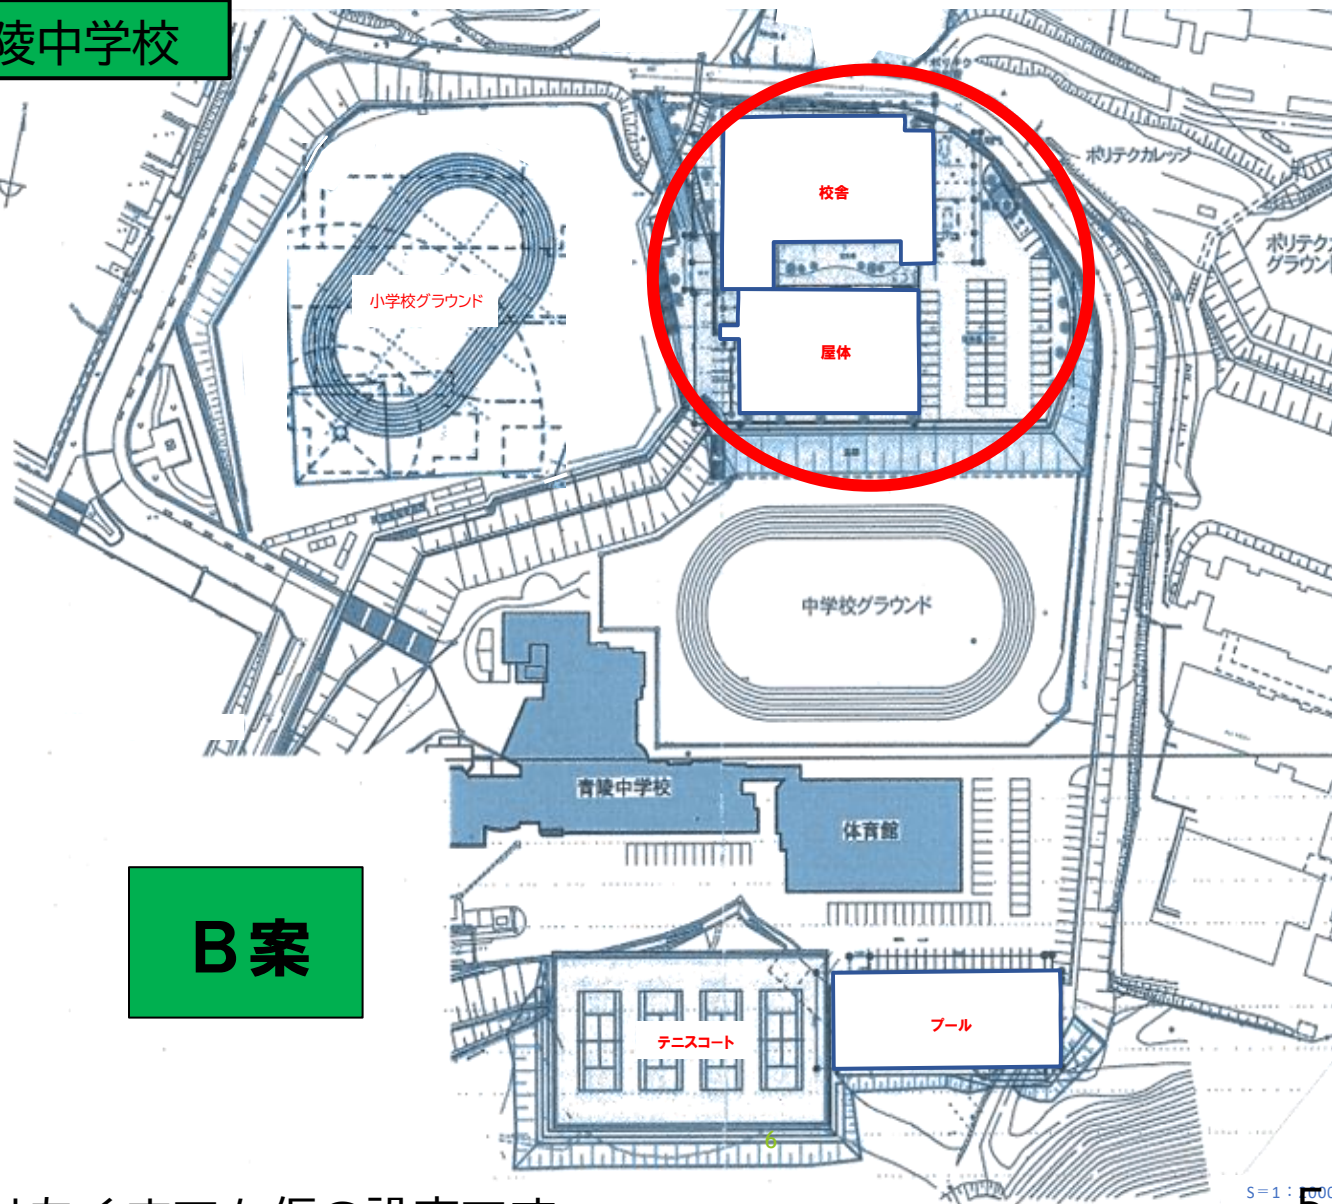

B案

※建物等の配置はあくまでも仮の設定です。

3. 津宮小学校敷地への建設決定理由について

A案

●津宮小学校敷地

校舎等の建築可能面積は、青陵中学校敷地7千㎡と比較し、2倍の面積となる1万4千㎡が確保できる。

B案

●青陵中学校敷地

校舎が4階建となる、青陵中学校の既存施設の代替施設としてテニスコートや野球場も別に建設する必要がある、プール建設場所が遠くなる。


今以上に交通安全上の問題を解消するためには、道路の拡幅が必要となるが、多額の経費と長い期間がかかることが予想される。

経費の問題、代替施設の問題など…。

- ゆとりをもった空間形成が可能となること
- 安全な通学路に関すること、など…。

「総合的に判断」

4. 津宮小学校敷地利用での概略計画について

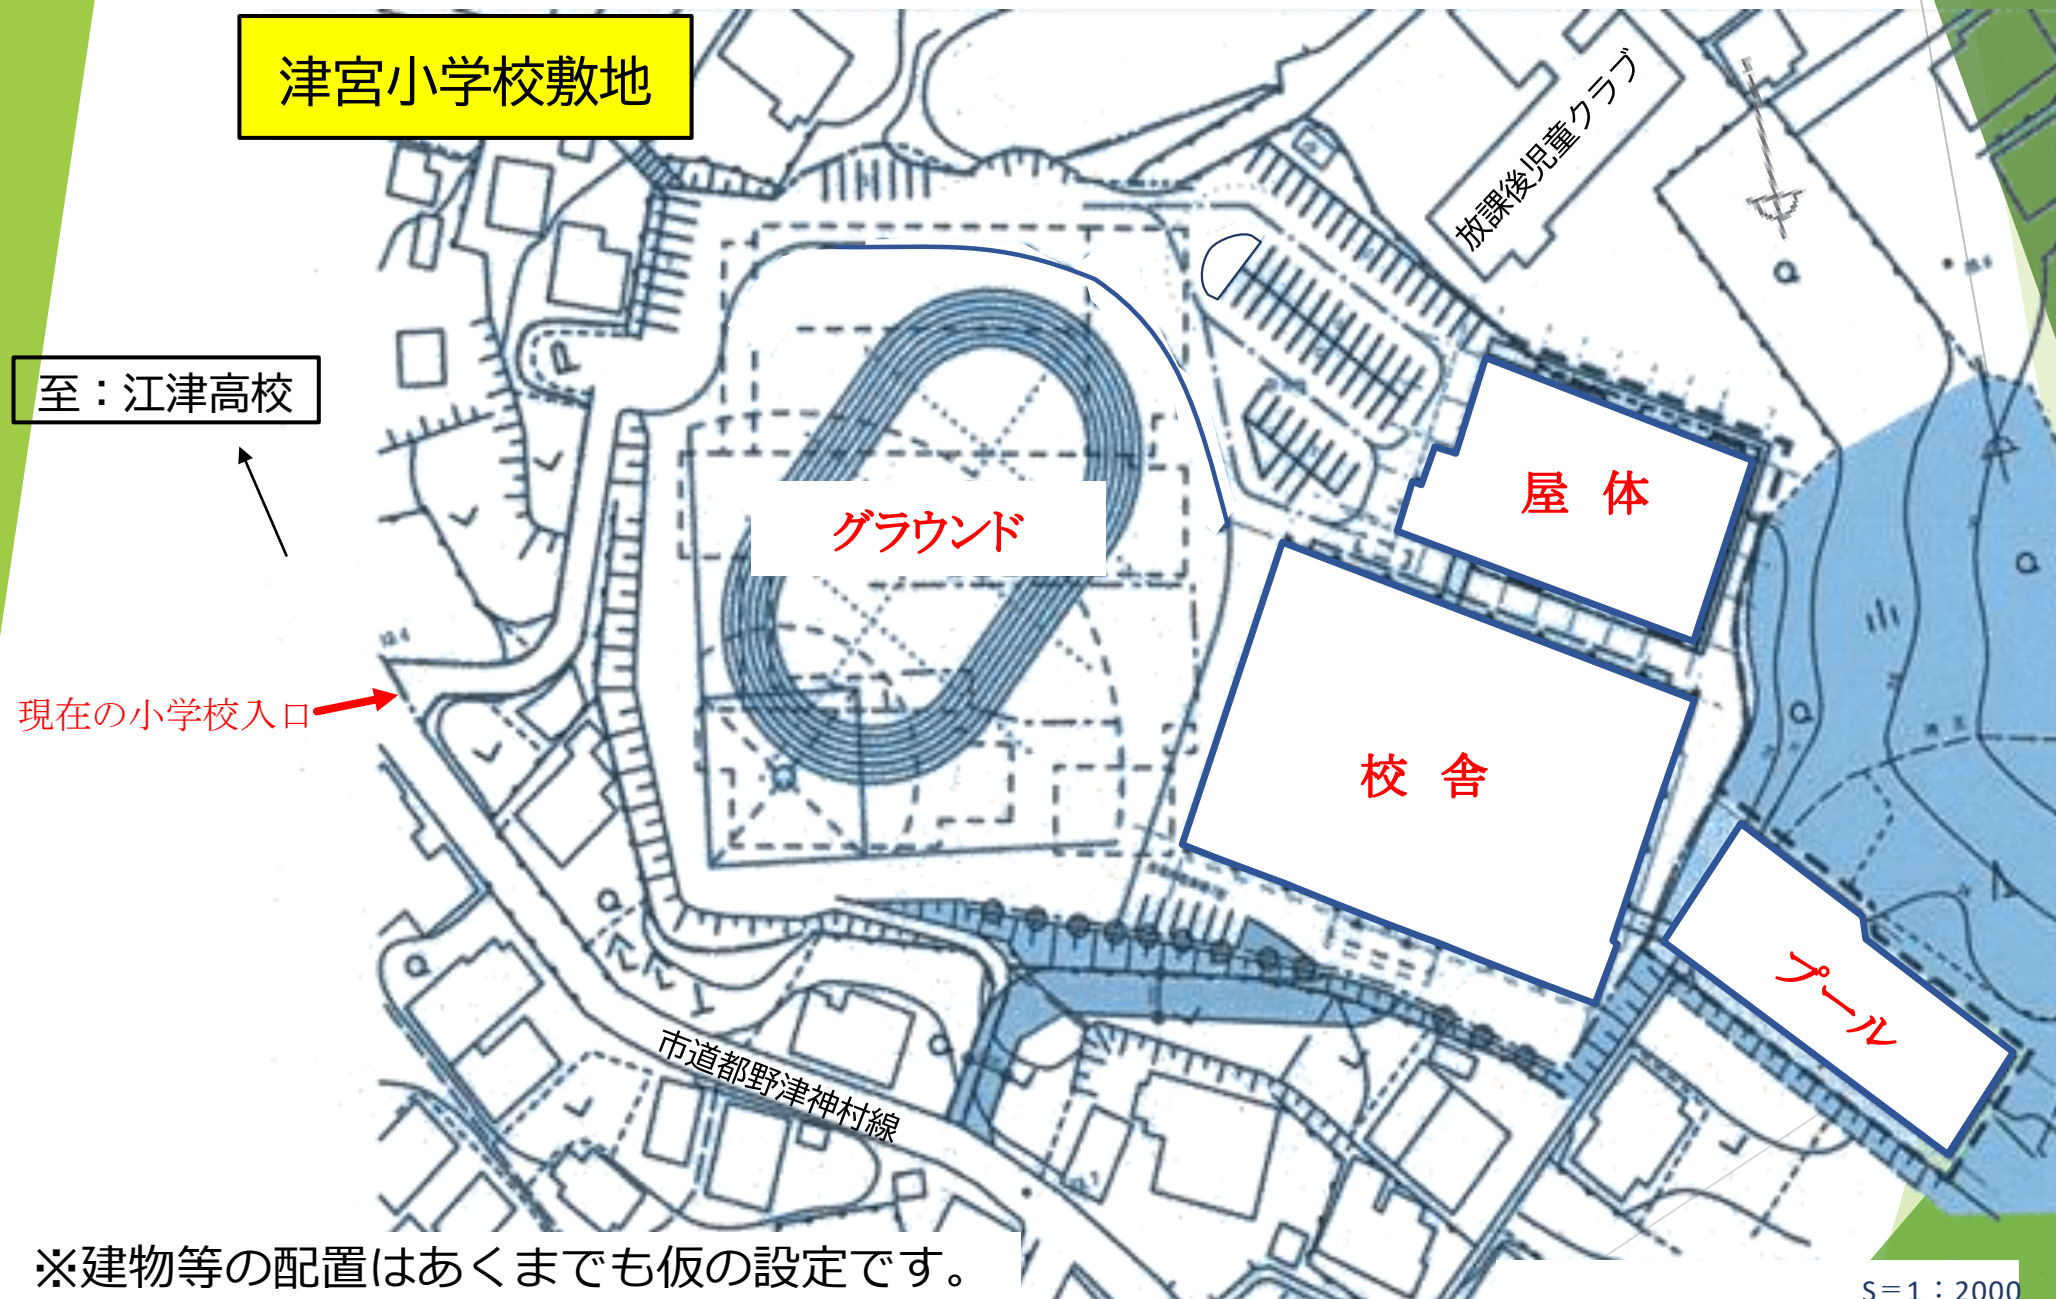

4. 津宮小学校敷地利用での概略計画について

(1) 統合小学校の基本計画

『整備の基本方針』

- ①教育活動をより充実させるための学校施設
- ②全ての利用者にとって安全・安心な学校施設
- ③ユニバーサルデザイン
- ④地域拠点としての学校施設
- ⑤将来の変化に対応できるフレキシブルな施設計画
- ⑥ICT化利活用のための基盤整備
- ⑦適正な施設規模等の考え方

4. 津宮小学校敷地利用での概略計画について

(2) 事業スケジュール (案)

※スケジュールは現時点の予定

年次 項目	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
・土木工事	測量設計	造成工事					
・建築工事	基本設計	実施設計	建築工事				
・解体工事					解体工事		
・外構工事						グラウンド整備他	

◎工事期間中はグラウンドが使用できない期間が生じます。

4. 津宮小学校敷地利用での概略計画について

(2) 事業スケジュール

- ①**統合小学校に向けての準備事項**
学校名、校歌、校章、制服等の検討(令和8年度から)
- ②**統合小学校の開校時期**
保護者と確認
- ③**児童の通学対応**
スクールバス対象地域、経路の検討
- ④**川波小学校の廃校後の校舎・敷地の考え方**

【参考】 統合小学校からの距離

